PT BULAWAN DAYA LESTARI

Production Report Processing Plant Oktober 2026

1. Rom File Inoventory CIL Processing Plant Sept-Oktober

Stock ROM CIL September-Oktober 2026
PT BULAWAN DAYA LESTARI

No	Date	Sampel ID	Ore Stacking (Dome)	Ore Type - Lithology	Truckcount (m3)	Survey (m3)	Bulk Density	Tonage by survey (WMT)	Toange By Truckcount
1	01/06/2026	G 00290-00313 BB	RP_VM_1	Vein		41	1,35	55	0
2	01/06/2026	G 00272-00279 BB	RP_SV_1	Sandy Oxide		16	1,35	22	0
3	02/06/2026	G 00318-00329 BB	RP_VM-2	Sisa Sandy Oxide		93	1,35	126	0
4	02/06/2026	G 00330-00333 BB	RP_SV_2	Vein		40	1,35	54	0
5	02/06/2026	G 00350-00352 BB	RP_VM_3	Sandy Oxide		13	1,35	18	0
6	15/08/2026		Vein Sandly	Vein Sandly	200	310	1,39	431	278
7	16/08/2026		Bolder Vein	Bolder Vein	220	190	1,39	264	306
8	17/08/2026			Vein	210	34	1,39	47	292
9	18/08/2026			Vein	30	64	1,39	89	42
10	19/08/2026			Vein	60	62	1,39	86	83
11	20/08/2026			Vein	60	108	1,39	150	83
12	21/08/2026			Vein	150	130	1,39	181	209
13	23/08/2026			Vein	110	94	1,39	131	153
14	27/08/2026			Vein	100	310	1,30	403	130
15	28/08/2026			Vein	280	56	1,30	73	364
18	31/08/2026			Vein		23	1,3	30	0
22	04/09/2026			Vein		90	1,3	117	0
28	10/09/2026			Vein		312	1,3	406	0
29	17/09/2026			Oxide Cell A1		2291	1,3	2978	0
30	21/09/2026			Vein Sandly	113	92	1,3	120	147
31	23/09/2026			Vein Sandly OX	182	171	1,3	222	237
32	24/09/2026			Vein Sandly	86	86	1,3	112	112
33	25/09/2026			Vein Sandly	113	92	1,3	120	147
34	26/09/2026			Oxide		153	1,3	199	
35	27/09/2026			Vein		169	1,3	220	
36	29/09/2026			Oxide		21	1,3	27	
37	03/10/2026			Oxide		142	1,3	185	
38	05/10/2026			Oxide		65	1,3	85	
39	06/10/2026			Oxide		529	1,35	714	
40	06/10/2026			Vein		202	1,3	263	
Average							**1,33**		
Total					**1533**	**5061**		**7925**	**2582**

PT BULAWAN DAYA LESTARI

Production Report Processing Plant Oktober 2026

2. Crushing Production September – Oktober 2026

Crushing Production												
Date	Shift	PIC	Bucket	Type	Moisture %	Volume Bucket	SG Bulk Density (ton/m3)	WMT/SHIFT (wet metrix ton)	DMT/SHIFT (dry metrix ton)	Ton/hour (tph)	Tonage/Day (Tpd)	Keterangan
01/06/2026	Day										-	
	Night											
02/06/2026	Day	Toni	141	Exca PC 130	18%	0,5	1,35	95	78	16	78	
	Night											
03/06/2026	Day	Toni	32	Exca PC 130	18%	0,5	1,35	22	18	2	18	
	Night											
04/06/2026	Day	Deni	282	Exca PC 130	17%	0,5	1,35	190	158	16	158	
	Night											
18/08/2026	Day	Adi	62	Exca PC 130	12%	0,5	1,39	43	38	4	38	perbaikan conveyor cone crusher to ball mill
	Night											
19/08/2026	Day	Adi	463	Exca PC 130	12%	0,5	1,39	322	283	27	283	Istirahat jam 12:00-13:00
	Night											material vein bolder agustus 2026
20/08/2026	Day	Adi	539	Exca PC 130	10%	0,5	1,39	375	337	31	337	Istirahat jam 12:00-13:00
	Night											Vein Bolder Agustus
21/08/2026	Day	Adi	409	Exca PC 130	10%	0,5	1,39	284	256	27	293	isitrahat jumat 11-13, 16:20-16:55 Perbaikan Cone Crusher
	Night		10	Loader	10%	3,0	1,39	42	38			
22/08/2026	Day	Adi	315	Exca PC 130	10%	0,5	1,39	219	197	18	197	Material Habis hanya running 9 Jam
	Night											
23/08/2026	Day										-	
	Night											
24/08/2026	Day	Adi	234	Exca PC 130	10%	0,5	1,39	163	146	14	165	istirahat jam 12-13, material habis dan selesai jam 17:30
	Night	Toni	5	Loader	10%	3,0	1,39	20,85	19	2		
25/08/2026	Day										-	
	Night											
26/08/2026	Day										-	
	Night											
27/08/2026	Day	Toni	202	Exca PC 130	11%	0,5	1,39	140	125	12	125	Start Crusher jam 10:00, dikarenakan bari loading material jam 08:00, pada jam 15:30-17:15 stop dikarenakan material stuck pada cone crusher
	Night											
28/08/2026	Day	Toni	290	Exca PC 130	11%	0,5	1,3	189	168	16	168	Start Crusher jam 08:00, istirahat jam 11:00-13:00
	Night											
29/08/2026	Day	Toni	411	Exca PC 130	10%	0,5	1,3	267	240	22	240	istirahat jam 12-13, 14:00-15:00 ada loading material dari mining
	Night											
30/08/2026	Day	Toni	92	Exca PC 130	10%	0,5	1,3	60	54	5	54	
	Night											
10/09/2026	Day	Toni	113	Exca PC 130	10%	0,5	1,3	73	66	6	73	
	Night	Toni	2	Loader	10%	3,0	1,3	8	7	1		
11/09/2026	Day										-	
	Night											
12/09/2026	Day	Toni	329	Exca PC 130	10%	0,5	1,3	214	192	18	329	
	Night	Adit	233	Exca PC 130	10%	0,5	1,3	151	136	13		
13/09/2026	Day	Adi	204	Exca PC 130	10%	0,5	1,3	133	119	11	263	
	Night	Toni	245	Exca PC 130	10%	0,5	1,3	159	143	13		
18/09/2026	Day								-		201	Material dari cell A1 Heap Leach Labuha
	Night	Toni	360	Exca PC 130	14%	0,5	1,3	234	201	20		Udah ter mixxing kapur dan cement
19/09/2026	Day	Toni	178	Exca PC 200	13%	0,7	1,3	162	141	13	324	Material dari cell A1 Heap Leach Labuha
	Day	Toni	10	Loader	9%	3,0	1,3	39	35	3		
	Night	Toni	250	Exca PC 130	9%	0,5	1,3	163	148	14		
20/09/2026	Day	Toni	50	Exca PC 200	10%	0,7	1,3	46	41	4	210	Material dari cell A1 Heap Leach Labuha
	Day	Toni	20	Exca PC 130	10%	0,5	1,3	13	12	1		
	Night	Adit	190	Exca PC 200	9%	0,7	1,3	173	157	14		
21/09/2026	Day	Toni	300	Exca PC 200	9%	0,7	1,3	273	248	23	248	Log Sheet ilang kata mas wiliam
	Night											
22/09/2026	Day	Toni	38	Loader	10%	3,0	1,3	148	133	12	133	
	Night											
23/09/2026	Day	Toni	63	Loader	11%	3,0	1,3	246	219	20	403	
	Night	Adit	53	Loader	11%	3,0	1,3	206,7	184	17		
24/09/2026	Day	Toni	31	Loader	11%	3,0	1,3	121	108	10	220	
	Night	Adit	32	Loader	10%	3,0	1,3	125	112	10		
25/09/2026	Day	Toni	58	Loader	10%	3,0	1,3	226	204	19	218	
	Night	Alan	4	Loader	10%	3,0	1,3	15,6	14	1		
26/09/2026	Day	Toni	25	Loader	9%	3,0	1,3	98	89	8	254	
	Night	Alan	46	Loader	8%	3,0	1,3	179	165	15		
27/09/2026	Day										-	
	Night											
28/09/2026	Day										183	
	Night	Toni	51	Loader	8%	3,0	1,3	199	183	17		
29/09/2026	Day										-	
	Night											
30/09/2026	Day										121	
	Night	Toni	35	Loader	11%	3,0	1,3	137	121	11		
01/10/2026	Day	Toni	65	Loader	11%	3,0	1,3	254	226	21	295	
	Night	Toni	20	Loader	11%	3,0	1,3	78	69	7		
02/10/2026	Day	Toni	30	Loader	11%	3,0	1,3	117	104	10	232	
	Night	Toni	5	Loader	11%	3,0	1,3	20	17	2		
	Night	Gunawan	78	Exca PC 130	11%	0,5	1,3	51	45	4		
	Night	Gunawan	81	Exca PC 200	11%	0,7	1,3	74	66	6		
03/10/2026	Day	Vincert	63	Loader	9%	3,0	1,3	246	224	20	465	
	Night	Nuel	68	Loader	9%	3,0	1,3	265	241	22		
04/10/2026	Day	Vincent	17	Loader	9%	3,0	1,3	66	60	6	6	
	Night	Nuel					1,3					
05/10/2026	Day									-	22	
	Night	Agus	24	Exca PC 200		0,7	1,3	22	22	2		
06/10/2026	Day		27	Loader		3,0	1,3	105	105	9	105	
	Night											
07/10/2026	Day										204	
	Night		224	Exca PC 200		0,7	1,3	204	204	17		
08/10/2026	Day		181	Exca PC 200		0,7	1,3	165	165	14	477	
	Night		80	Loader		3,0	1,3	312	312	26		
Rata-rata			**182**		**11%**			**151**	**129**	**13**	**98**	
Total			**5.971**								**7.140**	

Total tonnage produksi yang sudah dilakukan proses crushing dari periode September-oktober 2026 adalah **7140 ton** update hingga 08/10/2026. Angka produksi periode September-oktober masih dilakukan penjumlahan hal itu dikarenakan masih ada ore sisa hasil crushing yang belum dilakukan proses penggilingan pada ball mill.

PT BULAWAN DAYA LESTARI

Production Report Processing Plant Oktober 2026

1. Material Process Milling Area and Leaching Area Production (Upstream) Oktober 2026

Batch Process	Waktu Penggilingan Ball Mill	Tonage/Hour	Batch	Tinggi Plat	Volume Slurry	
Siklus Pengolahan	Dalam satu proses batch pengolahan	Tph	Prosess	Slurry/Batch Proses	Per Batch Pengolahan	Material Solid (Ton)
1	36	10	1	9	971	347
2	47	9	2	9	971	418
3	34	10	3	7,6	818	311
4	27	12	4	7,7	827	307
5	18	18	5	8	863	310
Rata-Rata	32	12		8	889	338
Total Material (ton)						**1692**

PT BULAWAN DAYA LESTARI

Production Report Processing Plant Oktober 2026

Batch Process	Tank CIP	Date start	Time Start	Date Finish	Time Finish	Volume Slurry (m3)
1	2	06/10/2026	06:00	07/10/2026	06:00	971
2	3	08/10/2026	14:00	09/10/2026	18:00	971
3	2	10/10/2026	07:00	10/10/2026	19:00	818
4	3	11/10/2026	11:12	13/10/2026	02:00	827
5	2	13/10/2026	08:00	14/10/2026	08:00	863

Catatan :

A. Rata-rata waktu penggilingan material hingga mencapai target produksi dalam satu kali batch pengolahan mengalami perbedaan dikarenakan ada perubahan target tinggi volume slurry pada tanki. Pada proses pengolahan kali ini beberapa kendala yang terjadi Dimana terhambatnya waktu proses produksi yaitu water process yang diperlukan untuk pengolahan sangat kurang dan beberapa kali hanya mengandalkan Dump Truck untuk mengambil air dari Sungai yang mana air yang disuplai terbatas.

B. Saran pengolahan yang harus dilakukan pada batch selanjutnya tingkatkan %solid slurry pada tanki pengolahan untuk mengurangi kebutuhan air yang harus ditambahkan pada proses pengolahan leaching, serta %solid berpengaruh pada banyaknya material yang diolah, semakin kecil %solid semakin sedikit material yang diolah. Terlihat pada batch 1 dan 3, Dimana batch 1 volume slurry yang di isi 9 plalt hanya memperoleh 347 ton material hal itu kareana %solid yang rendah, sedangkan pada batch ke 3 dengan volume slurry 7,6 plat memperoleh **311 ton** cenderung sama dengan batch 1 hal itu karena pada batch ke 3 %solid pengolahan yang berlangsung lebih tinggi.

PT BULAWAN DAYA LESTARI

Production Report Processing Plant Oktober 2026

C. Rata-rata waktu penggilingan dalam satu kali siklus batch pengolahan yaitu 32 Hour. Adanya perbedaan lama waktu penggilingan pada proses milling hal itu dikarenakan adanya beberapa perubahan target volume slurry yang menjadi target akhir pengolahan dalam satu batch pengolahan.

D. Rata-rata tonnage yang diolah dalam satu siklus batch pengolahan adalah 338 ton.

E. Dari waktu effectif process yang sudah berjalan total rata-rata material proses ball mill ada pada angka 12 ton/hour.

F. Total tonnage yang sudah diolah hingga batch 5 periode oktober **1692 Ton.**

G. **Date Start** merupakan tanggal Dimana material yang masuk ke tanki leaching no 2/3 volume slurry yang di isi sudah mencapai target dari pengolahan yang akan dilakukan dalam satu batch proses.

H. **Date Finish** merupakan tanggal Dimana drain slurry atau toyong sudah mulai dilakukan.

I. Lamanya waktu proses leaching dan adsorption carbon dalam satu batch pengolahan berubah, untuk pengisian tanki sekitar 7 plat proses 12-15 hour proses berlangsung, sedangkan untuk 9-9,5 plat slurry yang di isi sekitar 18-24 jam.

J. Lamanya waktu proses leaching dan adsorption carbon aktif juga dipengaruhi kurangnya water process untuk melakukan jalannya drain slurry batch leaching pengolahan.

PT BULAWAN DAYA LESTARI

Production Report Processing Plant Oktober 2026

2. Tonage Produksi dan Head Grade ppm Leaching Process

Batch	Tinggi Plat	Volume Slurry	%Solid		Assay Lab Result Head Grade ppm			Asaay Lab Result Tail (Solid)			Assay Lab result tail (Solution)
Prosess	Slurry/Batch Proses	Per Batch Pengolahan	Pada Tanki Pengolahan	Material Solid (Ton)	Au	Ag	Cu	Au	Ag	Cu	Au
1	9	971	30%	347	0,524	0,793	20,324	0,08	0,30	12,56	0,02
2	9	971	35%	418	0,443	2,033	11,179	0,131	0,25	7,29	0,024
3	7,6	818	35%	311	0,381	0,419	9,163	0,140	0,295	10,39	0,03
4	7,7	827	35%	307	0,488	0,477	12,971				0,02
5	8	863	34%	310							0,024
Rata-Rata					0,459	0,930	**13,409**	0,120	0,280	10,08	0,028
Total											

Catatan :

a. Rata-rata grade pengolahan hingga batch ke 5 yaitu **Au 0,459 ppm, Ag 0,930, dan Cu 13,409 ppm**.

b. rata-rata tail solid tail pada pengolahan **Au 0,120, Ag 0,280, Cu 10,08**. Dan rata-rata solution tail pengolahan **Au 0,028**

c. pada batch ke 4 dan 5 grade solid tail belum ada hasil masih dalam tahapan proses Analisa pada lab assay PT BDL.

PT BULAWAN DAYA LESTARI


Production Report Processing Plant Oktober 2026

2. Down time dan Running Time Processing Plant

Data milling										
Date	Shift	PIC	Stop Time	Start Time	Down Time (Mins)	Reason	BATCH	Running Time Hour/Shift	Availibility per Shift	Availibility Per Day
01/10/2026	Day		00:01:00	12:01:00	720	perbaikan tanki thickener		0	0%	
01/10/2026	Night		00:01:00	12:01:00	720	perbaikan tanki thickener		0	0%	0%
02/10/2026	Day		00:01:00	12:01:00	720	perbaikan tanki thickener dan tanki floculation tank		0	0%	
02/10/2026	Night		00:01:00	12:01:00	720	perbaikan tanki thickener, floculation dan filter press		0	0%	0%
03/10/2026	Day		00:01:00	12:01:00	720	perbaikan tanki thickener, floculation dan filter press		0	0%	
03/10/2026	Night		00:01:00	12:01:00	720	perbaikan tanki thickener, floculation dan filter press		0	0%	0%
04/10/2026	Day		00:01:00	00:01:00	0	running ball mill 1,2 dan 3		12	100%	
04/10/2026	Night		00:01:00	00:11:00	10	Peralihan genset	1	12	99%	99%
05/10/2026	Day		00:01:00	00:01:00	0	ball mill running no 3 dan 2		12	100%	
05/10/2026	Night		00:01:00	12:01:00	720	Ada perbaikan pada tanki thickener tank,		0	0%	50%
06/10/2026	Day		00:01:00	12:01:00	720	Perbaikan tanki thickener tank		0	0%	
06/10/2026	Night		00:01:00	08:01:00	480	start ball mill jam 03:00 ball mill 1 dan 2	2	4	33%	17%
07/10/2026	Day	Hendra	00:01:00	00:01:00	0	Running Ball Mill 07:00 -14:00 ball mill 1 dan 2, ball mill 3 running jam 14:00		12	100%	
07/10/2026	Night	Nivto	00:01:00	00:21:00	20	Running Ball Mill jam 19:20		12	97%	99%
08/10/2026	Day	Hendra	00:01:00	00:01:00	0	Running ball mill 1,2,3 7:00	3	12	100%	
08/10/2026	Night	Octa	00:01:00	00:31:00	30	Running Ball Mill 1,2,3 19:30		12	96%	98%
09/10/2026	Day	Unknown User	00:01:00	02:01:00	120			10	83%	
09/10/2026	Night				0	Trouble pada tanki thickener		12	100%	92%
10/10/2026	Day				0	kurangnya air dalam proses pengolahan dan ada perbaikan pada tanki floculation		12	100%	
10/10/2026	Night	Octa	12:01:00	14:30:00	149	Ball mill 1,2,3 mati di jam 4:30, jalan ball mill 2 doang di jam 7:20	4	10	79%	90%
11/10/2026	Day	Hendra	12:01:00	19:00:00	419	Ball mill 1,2,3 baru jalan di jam 12:20 (GENSET), stop lagi di jam 17:13		5	42%	
11/10/2026	Night		00:01:00	00:01:00	0	ball mill running 1,2 dan 3		12	100%	71%
12/10/2026	Day		00:01:00	00:01:00	0	ball mill 1,2,3 jalan	5	12	100%	
12/10/2026	Night		00:01:00	00:01:00	0	ball mill 1,2,3 jalan		12	100%	100%
13/10/2026	Day		00:01:00	06:21:00	380	Finish pump slurr to tank 2 batch 17 jam 11:40, produksi berhenti karena proses drain slurry tank 3 lambat dikarenakan kurangnya air pada proses pengolahan		6	47%	72%
13/10/2026	Night		00:01:00	00:26:00	25	start ball mill jam 19:25 no 1,2, dan 3	6	12	97%	

PT BULAWAN DAYA LESTARI

Production Report Processing Plant Oktober 2026

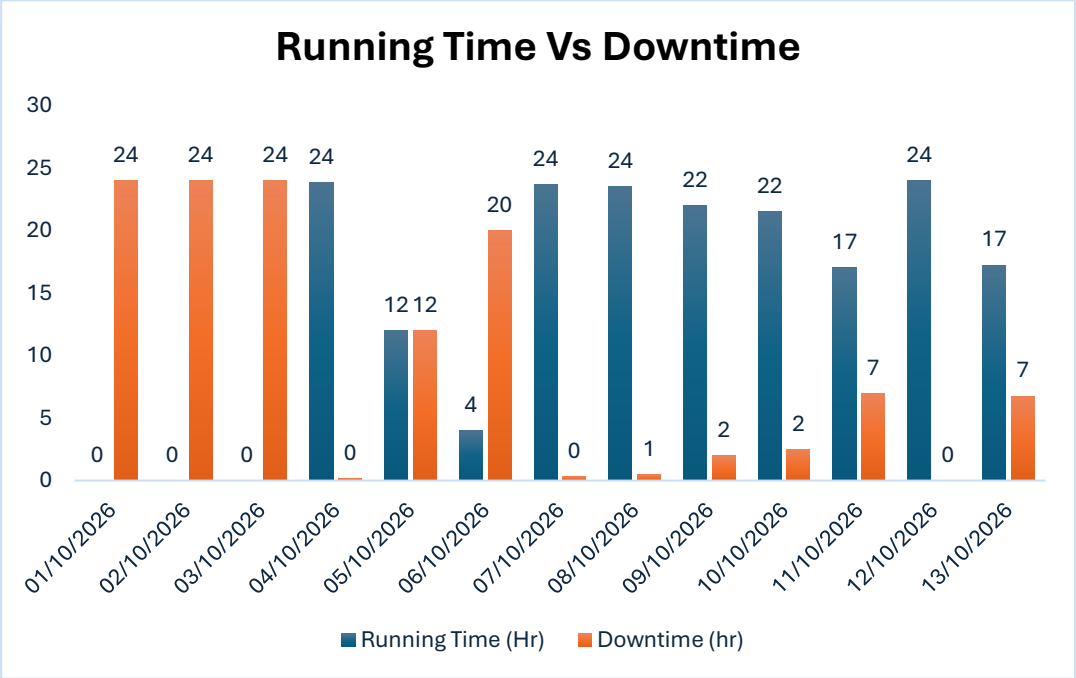

189	123	61%
Running Time Hour Tercatat	Down Time Hour Tercatat	%Plant Availability

Ringkasan :

1. Running processing plant untuk periode oktober dimulai dari tanggal 04/10/2026. Dari tanggal 1-3 oktober 2026 terjadi downtime hal itu dikarenakan sedang dilakukan perbaikan pada agitator thickener tank.
2. Pada tanggal 6 september downtime Kembali terjadi selama 20 jam hal itu dikarenakan ada penumpukan material pada thickener tank yang menyebabkan stuck nya agitator thickener tank. Penyebab penumpukan material pada tanki thickener tank hal itu dikarenakan lambatnya material yang turun kebagian bawah tanki sehingga proses pompa slurry ke tanki kurang efektik dan material hanya tertahan pada pinggiran dasar tanki tidak berpusat pada titik Tengah atau kerucut tanki.
3. Total downtime pada processing plant hingga 13 oktober 2026, 123 Hour atau 5 hari kerja waktu produksi sudah hilang.
4. %Availability processing plant untuk proses milling dan leaching adalah 61%.
